



## **2. これまでの経過**

平成30年8月

国土交通省 準備段階調査箇所に採択

令和元年9月

国土交通省 連結許可及び新規事業に採択

令和2年3月・4月

大田和行政区説明会・川房行政区役員説明会（事業概要）

令和2年8月～令和3年3月

測量、地質調査

令和3年3月～令和4年10月

道路詳細設計・橋梁設計

令和3年7月～8月

埋蔵文化財調査（四ツ栗遺跡、広谷地遺跡）

令和3年7月～令和4年3月

道路法95条の2第2項及び高速自動車国道法第24条の2の規定に基づく  
連結協議

令和3年11月

大田和行政区説明会・川房行政区説明会（整備計画の概要等）

令和4年3月

地権者説明会（道路詳細計画、事業スケジュール等）

令和4年度～


用地測量、物件調査、不動産鑑定

令和5年度～

用地取得、物件移転の交渉・契約

---

### 3. 事業工程

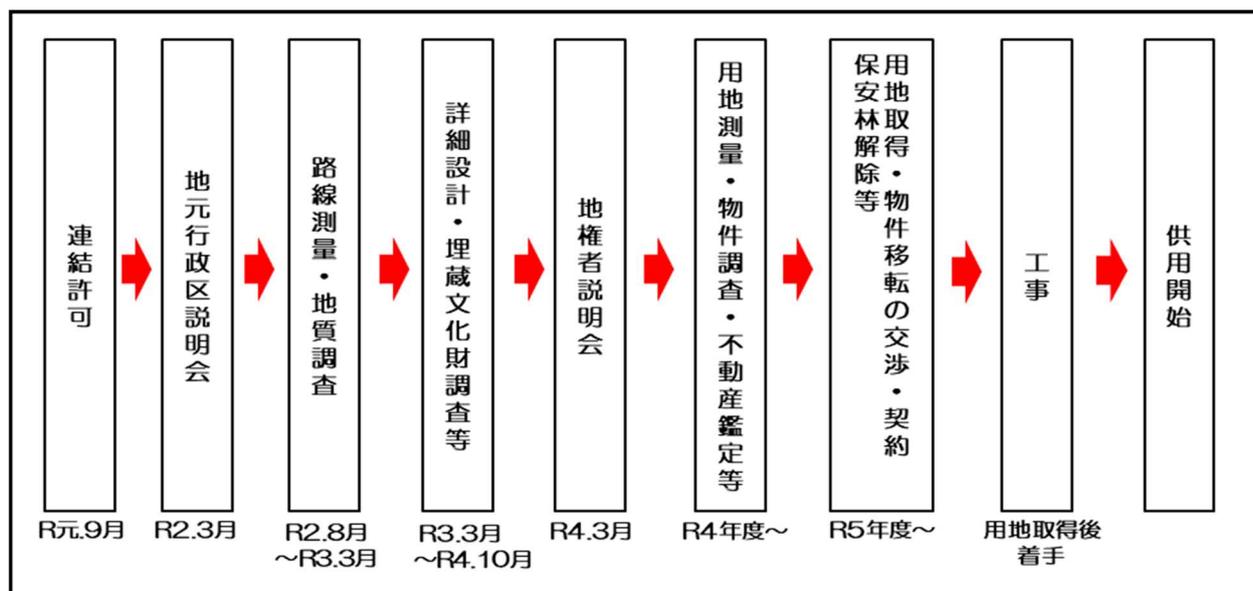

### 4. 現在の進捗状況

- ・令和5年度から用地取得、物件補償のための用地交渉を進め、おおむね9割の契約締結を完了しております。
- ・引き続き、残りの用地交渉を進め、用地取得、物件補償が全て完了した時点で、速やかに工事着手できるように、ネクスコと調整をしております。

### 5. 今後の見通し

- ・現段階においては、残りの用地交渉を実施している段階であり、用地交渉の進み具合や工事の過程で想定外の要因等（災害発生、労務者及び資機材の確保困難等）により工事期間が変更になる場合がありますので、本スマートICの開通時期については、工事完成の見通しが立った段階での公表になると国土交通省、ネクスコから伝えられております。
- ・よって、開通時期については工事の見通しが立った段階で改めてお知らせします。
- ・今後も早期の供用開始に向けて事業進捗に努めてまいります。
