

南相馬市復興事業等の主な進捗状況について（平成27年11月15日現在）

前月から主な変更箇所は下線あり

現在の避難状況

住民基本台帳ベース(単位:人)

区分		(参考) H26.4.3	(参考) H27.4.2	H27.10.15	H27.11.15	前月からの 増減	
住民登録人口	+++ 市全体	64,148	63,555	64,095	63,976	119	死亡/転出:202人 出生/転入:83人
市外避難者数	市全体	14,438	12,411	11,284	11,196	88	死亡:11人 転出:71人
	(小高区)	5,316	5,067	4,922	4,911	11	
	(鹿島区)	820	609	504	500	4	
	(原町区)	8,302	6,735	5,858	5,785	73	
市内仮設住宅 入居者数	市全体	5,508	4,872	4,132	4,047	85	死亡:6人 転出:2人
	(小高区)	3,457	3,219	2,923	2,880	43	
	(鹿島区)	784	548	362	326	36	
	(原町区)	1,267	1,105	847	841	6	
市内借り上げ住宅等 入居者数	市全体	3,775	3,716	3,658	3,629	29	死亡:7人 転出:7人
	(小高区)	2,367	2,440	2,484	2,476	8	
	(鹿島区)	222	192	180	180	0	
	(原町区)	1,186	1,084	994	973	21	
自宅	市全体	40,427	42,556	45,021	45,104	83	死亡:40人 転出:58人
	(小高区)	-	-	0	0	0	
	(鹿島区)	-	-	9,782	9,871	89	
	(原町区)	-	-	35,239	35,233	6	
他市町村からの 避難者数	市全体	1,966	2,103	2,256	2,253	3	
市内居住人口	+++ 市全体	51,676	53,247	55,067	55,033	34	

転出: 9,202人
死亡: 4,281人

「市外避難者数」については88人の減（死亡・転出82人）となった。主な帰還先としては市内の自宅となっている。

「市内仮設住宅入居者数」については85人の減となっており、主に市内の自宅へ帰還している。

「市内借り上げ住宅等入居者数」は29人の減となった。主な帰還先としては市内の自宅となっている。

「自宅」については83人の増となっているが、内訳の大半は市外の避難先又は市内仮設住宅などから自宅を再建するなどして帰還したものである。「自宅」には市内転居や出生転入が含まれる。

以上から、市内居住人口は34人の減となった。

参考: 市内仮設住宅入居状況 平成27年11月19日現在

	戸数	入居戸数	入居率	入居人数	残戸数
鹿島区	2,184	1,601	73.3%	3,155	583
原町区	681	615	90.3%	1,146	66
合計	2,865	2,216	77.3%	4,301	649

(市外仮設住宅入居状況)

	割当戸数	入居戸数	入居率	入居人数	残戸数
相馬市	254	122	48.0%	300	132
新地町	-	68	100%	212	-

資料提供: 建築住宅課


除染関係

1 生活圏除染事業について

事業概要：市除染計画に基づき、市内において除染を実施し放射線量の低減に資する。

完了目標：平成 28 年度末

除染着手済面積：



区分	行政区	仮置場	除染
特定避難勧奨地点を含む地域	片倉、押釜、高倉、大谷、檜原、大原、馬場(雲雀が原)	整備済	終了
年間5ミリシーベルト超を含む地域	大木戸(牛越)、長野(北長野・石神・北新田)、信田沢、深野、上栃窪、栃窪、小池、矢川原、陣ヶ崎二	整備済	終了
	小山田、上太田、陣ヶ崎一	造成中及び格納中	実施中
比較的線量の低い「その他の区域」 1	北泉	造成中及び格納中	終了
	国見町、上町、西町、南町、三島町、仲町、本町、北町、小川町、東町、錦町、大町、栄町、旭町、橋本町、二見町、青葉町、桜井町、高見町、日の出町、 <u>上北高平、上高平、下北高平、鹿島区山下、御山、浮田、車川、岡和田、横手、角川原・白坂、牛河内、寺内、上寺内、塩崎、鹿島地区(西町・市街地、あさひ・台田中)</u>		実施中
	上記以外の原町・高平地区、鹿島区南柚木、永渡	設計・造成中	未実施
	横手(角川原・白坂)、牛河内、車川、寺内(寺内、上寺内、塩崎)、鹿島地区、上記以外の太田地区、大甕地区		未実施
上記以外の真野地区、八沢地区	区長・地域住民と協議中	未実施	


：国道 6 号の西部区域及び国道 6 号の東部

区域図及び進捗図

- 特定避難勧奨地点を含む地域
- 年間5mSv超を含む地域
- 国道6号の西部地域
- 国道6号の東部地域

進捗図(塗潰し)

- 除染実施済
- 除染作業中
- 仮置場確保済
- 仮置場確保中

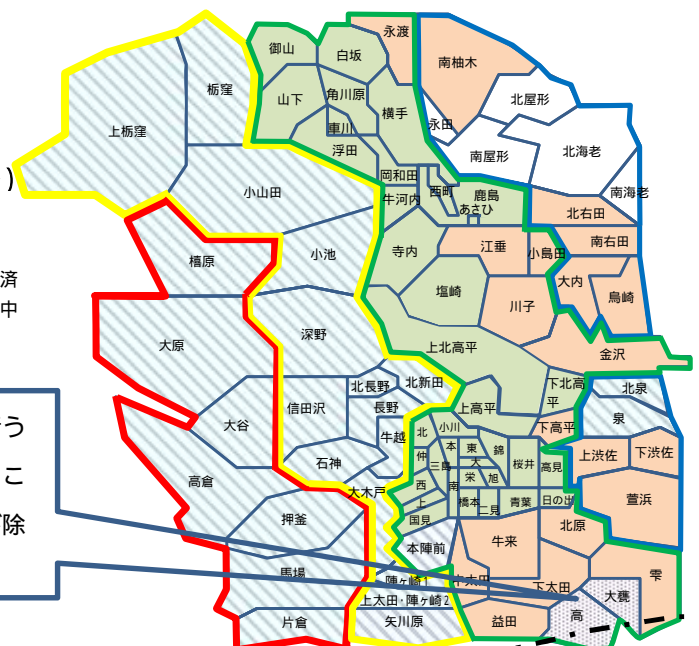

原町区高・大甕・小浜については、国が除染を行う除染特別地域と市が除染を実施する区域がまたがることから、除染事業者及び方法を統一するため、国が除染を行うことで11月6日に合意しました。

2 避難指示区域除染事業について（国事業）

事業概要：環境省は、特別地域内除染実施計画（南相馬市）に基づき、旧警戒区域及び旧計画的避難区域において除染を実施し放射線量の低減に資する。

完了目標：平成 28 年度末

除染実施率：（平成 27 年 10 月 31 日現在） 環境省ホームページから抜粋


	実施率	実績量	対象数量
宅地	52% (35%)	約 2,300 件(約 1,700 件)	約 4,400 件
農地	21% (18%)	約 640ha (約 540ha)	約 3,100ha
森林	49% (47%)	約 560ha (約 540ha)	約 1,200 ha
道路	10% (7%)	約 32ha (約 22ha)	約 320ha

()内は前月手済：

区分	行政区	除染	仮置場
第 1 工区	金谷、川房、大田和、神山	実施中	それぞれの地域に設置 造成・搬入中
第 2 工区	羽倉、大富		
第 3 工区	南鳩原、飯崎、片草、北鳩原、小谷、上根沢、小屋木	実施中	西部及び片草については、小谷、南鳩原、北鳩原、片草に跨る地域に設置し現在、造成・搬入中。 片草を除く中部及び東部については、行津地区に設置。現在、造成作業中
	1区から5区、岡田、大井、小高、吉名、川原田、女場、上姥沢、下姥沢、浦尻、行津、上浦、角部内、上耳谷、下耳谷、福岡、泉沢、下浦、 <u>塚原、村上、</u>	実施中	
	井田川	未実施	
	高一・二、小浜、江井、堤谷、鶴谷、米々沢、小木迫、下江井、雫	実施中	
	小沢	未実施	太田・大甕地区に造成・設計中
公共施設	-	実施中	(現地保管)

一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）のうち、何らかの行為が行われた状態
除染完了：

一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した状態

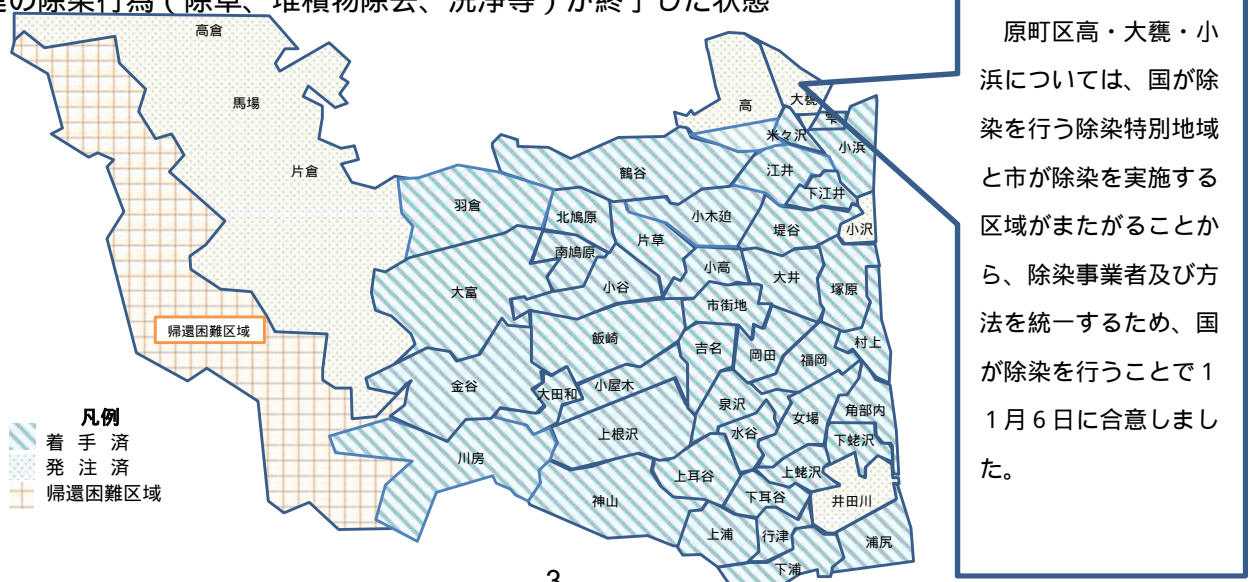


3 農地除染事業（その他の区域）について（市事業）

事業概要：市除染実施計画及び市農地除染基本方針に基づき、農地除染を実施し放射線量の低減に資する。

完了目標：平成 28 年度末

進 捗：


水路除染



実施率は前月から 3% 増加し 99%

（鹿島区永渡地区及び市内の一部暗渠部等を除き除染完了。）


農地除染



実施率は前月から 15% 増加し 78%

小浜、下渋佐地区及び原町区市街地の一部については 1 2 月上旬着手予定、その他の行政区については現在着手中。

農道除染



実施率は前月から 10% 増加し 17%

区分	地区名	除染状況
特定避難勧奨地点を含む区域	片倉、馬場、押釜、高倉、大谷、大原、檜原	着手中
年間 5 ミリシーベルト超を含む区域	上太田、深野、信田沢、北長野、長野、北新田、 <u>牛越</u> 、 <u>大木戸</u> 、矢川原、小池、 <u>小山田</u> 、上栃窪、栃窪	着手中
その他の区域	上北高平、 <u>下高平</u> 、永渡、 <u>山下</u> 、 <u>南柚木</u>	着手中

農道除染は本格的には 8 月より着手したところであり、上記に記述のない地区は順次除染開始、年度内完了を目標とする。

廃棄物処理関係

4 災害廃棄物処理事業（避難指示区域）について（国事業）


事業概要：環境省が旧警戒区域内のがれき処理、片付けごみ処理、被災家屋の解体撤去、被災車両の撤去を行うもの。

完了目標：平成 28 年度末


災害廃棄物搬入量（津波がれき、片付けごみ、解体家屋等）

312,031 t（津波がれきは搬入完了）

被災家屋等解体撤去率



被災自動車撤去率



7月21日から解体開始（発注件数：827件）

残りの2台については撤去方法を検討中


荒廃家屋解体申請件数：598件（10月末時点）件（解体開始は平成28年度から）

5 災害廃棄物処理事業（その他の区域）について（市事業）


事業概要：市が旧警戒区域外のがれき処理、倒壊家屋の解体撤去、被災自動車の撤去を行うもの。

完了目標：平成 28 年度末

災害がれき搬入率



損壊家屋解体撤去率



仮置き場に埋設されている 122,029t を搬入量とし

解体率約 99.8%

て計上。災害がれきの搬入については概ね完了。

住宅関係


6 災害公営住宅整備事業について

事業概要：被災者の居住の安定確保のため、災害公営住宅を建設する。

（原町区 5 地区、鹿島区 3 地区、小高区 3 地区）

完了目標：平成 27 年度末

工事着工・完了率

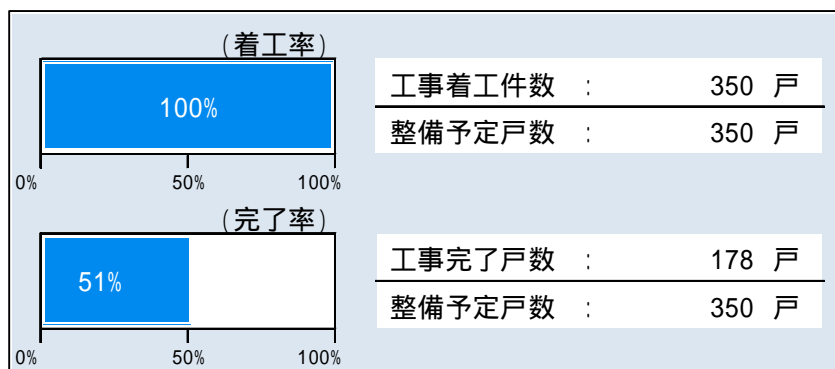

先月から変更なし。

地区	事業箇所	戸数	事業完了	進捗状況
原町	大町東地区（大町駐車場）	80戸	27年3月	入居開始
	大町西地区（旧市立病院）	40戸	27年2月	入居開始
	大町南地区（旧サティ）	29戸	28年1月	建設工事に着手
	集合住宅（栄町地区）	33戸	28年3月	建設工事に着手
	戸建住宅（萱浜地区）	38戸	28年3月	建設工事に着手
鹿島	西町	30戸	26年9月	入居開始
	西川原	28戸	26年3月	入居開始
	西川原第二	32戸	28年3月	建設工事に着手
小高	東町	20戸	28年2月	建設工事に着手
	万ヶ迫	2戸	28年2月	建設工事に着手
	集合住宅（上町地区）	18戸	28年2月	建設工事に着手

7 防災集団移転事業について


事業概要：被災地域住民の安全確保のため、集団移転を支援する。

完了目標：平成27年度

（避難指示区域）

- ・平成26年度に再度行った意向調査の結果、希望がなかったことから、計画していた住宅団地11地区、及び新たに検討していた小高市街地への計画を取りやめ、20km圏内の全ての防集団地を廃止とする。
- ・移転元の移転促進区域の買取りについては、26年8月から個別に意向確認に着手し、27年2月から買取り契約を開始。

（その他の区域）



計画 団地	工事中		工事完了	
	21	0	鹿島区 -	21

- ・H24年8月より移転者に対する補助金交付を実施。
- ・移転元の買取り契約を平成25年9月下旬から開始。
- ・住宅団地の分譲契約を平成25年12月5日から開始。
- ・北泉地区は廃止。

参考：「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」（個人移転）の申請件数

平成24年度：40件 平成25年度：67件 平成26年度：42件 平成27年度：15件

8 宅地造成事業について

事業概要：本市へ個別移転や定住を希望する原発被災者及び津波罹災者に対し、市街地へ分譲住宅地を提供する。

原町区大木戸地区 59区画


完了目標：平成28年度中

進捗：設計・施工一括工事発注済（設計業務において関係機関と協議中）

都市基盤関係


9 道路復旧事業について（市事業）

（避難指示区域）



前月から変更なし

（その他区域）



前月から変更なし

区域	被災概要	完了予定	被災箇所	工事発注	完了	完了率
避難指示区域	地震災害道路	完了	92	92	92	100%
	津波災害道路	27年度内	35	29	28	81%
	橋梁災害道路	27年度内	5	4	3	66%
その他の区域	地震災害道路	完了	73	73	73	100%
	津波災害道路	27年度内	46	37	36	79%
	橋梁災害道路	完了	4	4	4	100%

10 道路復旧事業について（県事業）

災害復旧事業

区域	区分	被災箇所	着手箇所	完了箇所	概要
避難指示区域	道路災害復旧事業	43	40	39	<ul style="list-style-type: none"> 道路の未着手箇所は年度内に発注予定。 橋梁1箇所（ハツカチ橋）についても、年度内に発注予定。
	橋梁災害復旧事業	6	5	4	
その他の区域	道路災害復旧事業	26	25	25	<ul style="list-style-type: none"> 未着手箇所は、関係機関と協議中。 残りは、H27工事完了予定。
	橋梁災害復旧事業	3	3	3	

その他の事業

区 分	状 況
県道原町川俣線八木沢工区(道路改良)	・トンネル工事の起工式を平成26年3月25日に行い、トンネル工事を実施中。平成30年代の早い時期に全線開通を目指す。
県道大芦鹿島線檜原工区	・26年8月に工事着手、平成27年度の工事完了を目指す。
県道原町海老相馬線	・南海老地内は、26年7月に工事着手。 ・烏崎地内は、27年4月に工事着手。 ・沖田地内は、27年7月に工事完了。

区 分	状 況
県道北泉小高線	避難指示区域 ・26年度に概略設計完了。 ・27年度は引き続き調査・ 予備 設計を行う。 その他の区域 ・萱浜地内の嵩上げ区間は、26年度工事一部発注済み。 ・雫地内のバイパス区間は、27年3月に工事着手。
県道広野小高線	避難指示区域 ・26年度に概略設計完了。 ・27年度は引き続き調査・ 予備 設計を行う。

1.1 都市防災推進事業（北泉海浜総合公園の復旧等）について

事業概要：被災した北泉海浜総合公園を、震災前のように市民の憩いの場として復旧・復興するため、地域住民等と一緒に取り組み整備を図る。

完了目標：平成29年度

進 捗：

- ・高台エリアの災害復旧工事は、27年3月末完了。
土木工事...都市公園施設等 電気工事...配電線路設備等 機械工事...屋外排水設備等
- ・津波被害エリアの災害査定は26年11月17～18日に実施、査定率98.5%。28年度末の工事完了予定。
- ・除染対策事業にて高台エリアの空間線量の低減化を図る。26年9月26日契約締結、27年3月末完了。
- ・上記、災害復旧事業及び除染対策事業の完了を受けて、高台エリアをH27年4月末に再開している。
- ・北泉海浜総合公園に隣接する、防災集団移転事業で買い取った土地の一部を利用して震災メモリアルパークの整備を検討する。
- ・**津波被災エリアの土木工事・橋梁工事（上部工）は27年12月契約予定。**

1.2 河川災害復旧事業について

（避難指示区域）

- ・復旧箇所：1箇所（小沢川）
- ・災害査定は25年10月に完了。工事発注準備中で27年度完了を予定。

（その他の区域）

- ・復旧箇所：4箇所（金沢川3箇所、真野川右支）

- ・災害査定はすべて 25 年 6 月に完了。金沢川 3 箇所は 26 年 3 月に工事完了。
真野川右支は、26 年 9 月に工事発注し 27 年度工事完了予定。

1.3 河川・海岸災害復旧事業について（県事業）

区域	区分	被災箇所	着手箇所	完了箇所	概要
避難指示区域	河川災害復旧事業	45	41	36	雫海岸は 28 年 1 月末に完了予定。 小浜海岸は 27 年 9 月に完了
	海岸災害復旧事業	9	9	1	
その他の区域	河川災害復旧事業	17	17	10	北泉大磯海岸の一部工事は、27 年 9 月に完了。
	海岸災害復旧事業	5	5	1	

1.4 海岸災害復旧事業（農林海岸部）について（県事業）

避難指示区域 5,325m

- ・農地海岸堤防については復旧工事に着手。（28 年度完了予定）

その他の区域 1,074m

- ・農地海岸堤防については復旧工事に着手。（27 年度完了予定）
- ・漁港海岸堤防については復旧工事に着手。（27 年度完了予定）

1.5 海岸防災林造成事業について（県・市事業）

事業概要：総延長約 17.0 km、林帯幅 200m、中央部分に津波で発生した瓦礫（再生資材）を盛土として利用。

県施工 植生基盤盛土等

鹿島区は、25 年 4 月から市有地において工事に着手。現在、北海老、南海老地区において工事を実施中。原町区においては、平成 26 年 3 月から萱浜・雫地区において工事に着手。小高区においては、現在、塚原地区において工事を実施中。用地測量完了地区から順次用地買収を進め工事実施予定としている。

市施工 再生資材盛土部分

- ・盛土位置・構造等について関係機関と協議を進めている。
- ・20 km 圏外については、原町区萱浜・雫地区及び北泉において一部造成完了。
- ・鹿島区海老・右田地区において造成工事実施中。10 月以降北海老地区及び北萱浜地区で工事実施予定。
- ・20 km 圏内については、小高区内の家屋解体瓦礫及び JR 常磐線の復旧工事からでる碎石等を塚原地区の高盛土部分へ盛土材搬入中。

1 6 農地・農業用施設災害復旧事業について

避難指示区域

市営事業：平成 24 年度 37 箇所、平成 25 年度 75 箇所、平成 26 年度 20 箇所について災害査定済。

7 月までに工事 5 件発注済（田 3 箇所、道路 2 箇所、ため池 11 箇所）

県営事業：小高排水機場、原町南部地区（農地）復旧中。

国営事業：3 排水機場（谷地・村上第二・塚原第二）について応急復旧工事が完了。

5 排水機場（小沢、谷地、塚原第二、村上、福浦南部）本復旧工事中。

1 排水機場（小浜）完了

その他の区域

市営事業：平成 25 年度までに 43 箇所発注し平成 27 年 7 月までに完了。平成 27 年 7 月に 2 箇所完了。

平成 26 年度以降 16 箇所発注済。

県営事業：平成 25 年度に 3 排水機場復旧工事完了（八沢、泉、前向）。

2 排水機場復旧工事中（八沢浦、金沢）。

1 7 農山漁村地域復興基盤総合整備事業について（県事業）

地区	事業地区	完成予定	県営土地改良事業計画確定	工事契約	工事着手
鹿島	八沢	31 年度末	25 年 12 月	26 年 3 月	26 年 6 月
	右田・海老	31 年度末	26 年 1 月	26 年 12 月	27 年 1 月
	真野	32 年度末	26 年 2 月		
原町	金沢・北泉	29 年度末	25 年 5 月	27 年 9 月	27 年 10 月
	原町東	31 年度末	25 年 7 月	26 年 3 月	26 年 5 月

1 8 真野川漁港整備事業について

事業概要：本格的な操業再開に向けて各施設を整備する。

完了目標：（25 年度）漁船保全修理施設済、

（26 年度）漁具倉庫済

（27 年度）水産物鮮度保持施設、水産物荷捌き施設、海水処理施設、作業場

（28 年度）オイルフェンス

進捗：漁船保全修理施設建設工事については、26 年 3 月に工事完了。

漁具倉庫については、27 年 3 月に工事完了。水産物荷捌き施設及び海水処理施設、水産物鮮度保持施設、作業場については 27 年度中、オイルフェンスについては 28 年度中に工事完了予定。

1 9 被災地域農業復興総合支援事業（施設園芸）について

事業概要： 早期の営農再開と風評被害克服のため、園芸施設（養液栽培）を整備する。24年度に原町区泉地区にドーム型の施設を整備済み。第2弾として鹿島区南海老地区に大型ハウスを整備し貸し出す事業。

- 進 捗： ・26年3月～4月に施設の貸与者の公募を実施。（公募件数：1件）
・26年7月に貸与者の決定。
・27年6月～8月に地質調査及び測量設計業務を実施。
・27年9月に公募型プロポーザルによる事業請負業者の公募実施。
・28年8月末に一部施設の竣工を予定。同年11月末の竣工を目指す。

2 0 南相馬市旧警戒区域内店舗営業報奨金について

事業概要：旧警戒区域内の復興を図るため、旧警戒区域内において生活に必要な生活物資等を販売する店舗再開事業者に対し予算の範囲内で報奨金を交付する。（平成26年4月1日施行）

申請件数：11件

小高区事業所の再開状況（小高区産業建設課調べによる）

	総数	再開済	廃業 (予定含)	その他 ()
小高区内事業所	489	211	36	242

（再開準備中・検討中・未確認等の事業所）

再開済211事業所の再開場所内訳

	小高区	原町区	鹿島区	県内 (市内除く)	県外
再開場所	46	80	22	40	23

2 1 小高区仮設店舗開設事業について

事業概要：避難指示解除準備区域等に指定されている小高区において、帰還住民の生活基盤を確保し、帰還促進を図るため、生活必需品等を販売する仮設店舗を整備し開設する。

完了時期：平成27年9月28日

- 進 捗： ・管理運営者については、4月末で決定。
・建設業者については、6月1日で決定。
・地権者との賃貸借については、6月1日で契約済。
・中小企業基盤整備機構による店舗建設は、9月25日で完成。
・内装工事・備品整備は、9月25日で設置済。
・店舗開店は9月28日（営業時間10：00～19：00日曜定休）
・現在営業中。

2.2 (仮称)南相馬市復興工業団地整備事業について

事業概要：原町区渋佐・萱浜地区に工業団地を整備し、雇用の場の確保・拡大を図る。

完了目標：平成 29 年度末（平成 28 年度末 一部供用開始）

進 捗：平成 24 年度：測量、地質調査、基本計画を作成。

平成 25 年度：基本設計 12 月に完了。埋蔵文化財調査を 3 月に完了。

平成 26 年度：実施設計 4 月に着手（9 月末実施設計完了）。第 1 期造成
工事発注

平成 27 年度：第 1 期造成工事期間

教育関係

2.3 学習塾等と連携した学力強化推進事業について

事業概要：学習塾と連携して中学校第 2 学年、3 学年に学習塾講師を派遣し授業等実施。

夏季休業中に第 3 学年のうち希望者を対象とした集中講座を開講。（学習塾講師に加えて大学生、卒業生も活用）

・実施教科：数学、英語

・実施回数：第 2 学年 10 月～3 月 月 2 日程度

第 3 学年 7 月～1 月 月 2 日程度、長期休業中月 2 日程度

8 月 4 日（火）～8 日（土）集中講座

実施日	実施日	実施校等	対象	内容
通常講座	7 月～1 月	市内各中学校	中学 3 年生	・仙台進学プラザ講師 ・数学、英語の 2 教科 ・基本徹底、応用発展の 2 コース
夏季集中講座	8 月 4 日 ～8 月 8 日	市労働福祉会館 ほか 3 会場	3 年生の希 望者	・仙台進学プラザ講師 ・福大生の学習補助員、卒業生 ・国語、数学、英語の 3 教科 ・通常、ハイクラスの 2 コース
通常講座	10 月～3 月	市内各中学校	中学 2 年生	・河合塾 NEXT 講師 ・数学、英語の 2 教科 ・基本徹底、応用発展の 2 コース

2.4 児童生徒の健康を守る安全・安心対策の実施について

事業概要：外出や屋外活動等を控えている児童生徒の精神的ストレスや運動不足の解消を図るため、学校へ専門家を派遣する。

・医師やスポーツトレーナーを派遣し、児童生徒に望ましい生活習慣や運動習慣を身につけてもらうための講話や実技講習会の実施。

・放射線に関する知識を有する専門医等を派遣し、保護者や教職員等対象に研修会の実施。（6 月から事業開始）

進 捗：

実施日	学校	講師	内容	対象
6月23日	鹿島中	南相馬市立総合病院医師 坪倉正治 氏	講演「放射線と健康管理」	全生徒 教職員
7月6日	太田小	スポーツアカデミー相馬 永沢 氏、岩佐 氏	全児童による水泳指導及びス ポーツ指導	全児童
7月8日	八沢小	日本体育協会公認ジュニ アスポール指導員 安齋博勝 氏	「親子で楽しめる遊び感覚のス ポーツ」	全児童 保護者
7月15日	原二小	野外教育事業所 ワンパク大学 三好利和 氏	レクリエーション室内運動	1・2年
9月2,3日	原一中	上智大学心理学科教授 久田 満 氏	「心のエクササイズ」 (リラクゼーションの授業)	1・2年 教職員
9月28日	原三中	放射線科学センター 高橋一智 氏	放射線についての講義・実験	全生徒
9月29日	福浦・金 房・鳩原 小	日本体育協会公認ジュニ アスポール指導員 安齋博勝 氏	「精神的ストレスや運動不足を 解消するためのレクリエーシ ョン活動」	全児童
<u>10月29日</u>	<u>原三小</u>	<u>日本体育協会公認ジュニ アスポール指導員 安齋博勝 氏</u>	<u>動きづくり運動(コーディネーシ ョン運動)</u>	<u>5・6年</u>
<u>11月5日</u>	<u>大甕小</u>	<u>日本体育協会公認ジュニ アスポール指導員 安齋博勝 氏</u>	<u>楽しくできる体力維持・向上のた めの運動</u>	<u>全児童</u>

2.5 市内の幼稚園・保育園の授業料等の無料化について

事業概要：・幼稚園授業料無料化事業

(公立幼稚園授業料を無料、私立幼稚園在籍園児の保護者に対して実質無料となるよう補助する。)

・保育園(所)保育料無料化事業

・認可外保育施設入所支援事業

(認可外保育施設に入所する児童に対して保育料の一部を助成する。)

参考：幼児・児童・生徒の在籍状況

(幼児数)

区分	震災前 園児数 A	H26.4.1		H27.11.1				待機 児童
		園児数 B	対震災前 B/A	園児数 C	対震災前 C/A	対前年 C - B	対前月	
保育園	1,142人	478人	41.9%	626人	54.8%	+148人	+4人	85人
幼稚園	1,198人	494人	41.2%	554人	46.2%	+60人	-1人	
計	2,340人	972人	41.5%	1,180人	50.4%	+208人	+3人	

(小学校児童数)

区名	H26.4.7 在籍者数 A	H27年度 予定人数 B	H27.1.8 在籍者数 C	H27.4.7(1学期開始日)			
				在籍者数 D	対予定 D/B	対前年 D - A	対前回 D - C
原町区	1,445人	2,146人	1,479人	1,470人	68%	+25人	9人
鹿島区	531人	598人	527人	546人	91%	+15人	+19人
小高区	155人	543人	157人	134人	24%	21人	23人
計	2,131人	3,287人	2,163人	2,150人	65%	+19人	13人

(中学校生徒数)

区名	H26.4.7	H27年度 予定人数 B	H27.1.8	H27.4.7(1学期開始日)			
	在籍者数 A		在籍者数 C	在籍者数 D	対予定 D/B	対前年 D - A	対前回 D - C
原町区	919人	1,308人	926人	960人	73%	+41人	+34人
鹿島区	310人	309人	310人	293人	94%	17人	17人
小高区	103人	326人	102人	100人	30%	3人	2人
計	1,332人	1,943人	1,338人	1,353人	69%	+21人	+15人

(高等学校生徒数) ・県教育委員会聴き取りによる ・定員は第1～3学年の合計

区分	H22.5.1現在		H26.4.9現在		H27.4.9現在		サテライト校(場所)
	定員	在籍者数	定員	在籍者数	定員	在籍者数	
小高商業高等学校	240人	217人	240人	141人	240人	164人	原町高等学校
小高工業高等学校	600人	588人	400人	305人	360人	290人	南相馬市 サッカー場
原町高等学校	720人	708人	520人	452人	480人	452人	
相馬農業高等学校	360人	331人	360人	281人	360人	243人	
相馬農業高等学校 飯館校	120人	88人	120人	54人	120人	69人	福島 明成高等学校
相馬高等学校	720人	705人	600人	583人	600人	591人	
相馬東高等学校	720人	711人	520人	502人	480人	479人	
新地高等学校	240人	202人	240人	180人	240人	166人	
双葉高等学校	480人	469人	120人	45人	80人	29人	いわき 明星大学
浪江高等学校	360人	312人	120人	33人	80人	27人	本宮高等学校
浪江高等学校津島校	120人	53人	120人	38人	80人	24人	安達高等学校
富岡高等学校	360人	326人	240人	174人	160人	119人	福島北高等学校 猪苗代高等学校 いわき明星大学 静岡県立三島長陵高等学校 ()
双葉翔陽高等学校	360人	340人	120人	49人	80人	29人	いわき 明星大学
計	5,400人	5,050人	3,720人	2,837人	3,360人	2,682人	

学校間連携校としてJFAアカデミー福島に在籍する生徒が通っている。

2.6 子どもの遊び場整備事業について

事業概要：子育てしやすい環境を整備することを目的として、子どもが楽しく、安心して遊ぶことができる施設を整備する。

場所：鹿島区鹿島字北千倉地内

完了目標：平成28年4月竣工(平成28年4月供用開始)

今後の予定：プロポーザル方式による一括発注

- ・プロポーザルの実施 (平成27年7月～8月)
- ・実施設計 (平成27年10月)
- ・ボーリング調査 (平成27年9月)
- ・倉庫解体 (平成27年11月～12月)
- ・駐車場整備工事 (平成27年11月～12月)
- ・建設工事 (平成27年12月～平成28年4月)
- ・遊具設置・外構工事 (平成28年2月～平成28年4月)

2.7 再生可能エネルギー導入推進事業について

事業概要：市が再生可能エネルギー発電基地の事業用地（市有地）を確保し、SPCが発電所を建設、運営を行う。

（沿岸部大規模太陽光発電所）

- ・平成25年3月に復興整備計画に基づく土地利用方針の国同意を得て、権利移転に向けて防災集団移転促進事業、土地改良事業との協議を進めている。
- ・平成26年4月にSPC（ソーラーパワー南相馬株）設立。
- ・平成26年12月に事業者と土地賃貸借予約契約を締結。

発電所名(仮称)	発電規模	計画場所・面積	工事着手
南相馬真野右田海老太陽光発電所	45.5MW	真野地区(約50ha)	28年1月予定 運転開始
		右田・海老地区(約60ha)	30年4月予定
南相馬原町東太陽光発電所	24MW	下渋佐・萱浜地区 (約46ha)	28年4月予定 運転開始 30年4月予定

（沿岸部風力発電所）

- ・平成25年6月にSPC（株南相馬サステナジー）設立。
- ・平成26年2月に環境アセスメント（特定環境影響評価）の手続き完了。
- ・海岸防災林造成事業等との調整を図り、保安林解除に向けて県と協議を進めている。

発電所名(仮称)	発電規模	計画場所・面積	工事着手
万葉の里風力発電所	9.4MW (2,350kW ×4基)	鹿島区南海老・北右田・ 南右田地区 (約5,000㎡×4箇所)	28年12月予定 運転開始 30年4月予定

公共施設再生可能エネルギー導入

事業概要：再生可能エネルギーの推進や、災害時における防災拠点施設等の最低限の機能維持を図るため、公共施設へ再生可能エネルギー設備及び蓄電池設備を導入する。

	施設名	設備容量		導入年度	進捗状況
		太陽光	蓄電池		
1	鹿島区役所	30.38kW	32.4kWh	25年度	26年1月工事完了
2	鹿島保健センター	16kW	22kWh	25年度	26年1月工事完了
3	原町保健センター	20kW	30kWh	25年度	26年3月工事完了
4	原町第一小学校	20kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
5	原町第二小学校	20kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
6	石神第一小学校	20kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
7	鹿島小学校	20kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
8	上真野小学校	15.75kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
9	大甕小学校	20kW	20kWh	26～27年度	26年9月発注

10	太田小学校	15kW	15kWh	26～27年度	<u>27年9月工事完了</u>
11	原町第三小学校	20kW	20kWh	27年度	27年7月工事着工
12	石神第二小学校	20kW	20kWh	27年度	27年5月工事着工
13	南相馬市役所	35kW	33kWh	27年度	27年5月工事着工
14	高平小学校	20kW	20kWh	27年度	27年5月工事着工
15	八沢小学校	20kW	20kWh	27年度	27年5月工事着工
16	小高小学校	15kW	15kWh	27年度	27年5月工事着工

2.8 小高区復興拠点施設整備事業について

事業概要：原子力災害による避難指示によって機能停止となった小高区の再生に向けて、住民が帰還し、安心して生活できる環境を整備し、復興の足掛かりなる復興拠点施設を整備する。

実施期間：平成30年4月（工事完了予定）

今後の予定：基本設計（7月公募開始、9/3受託候補者決定、10/28契約、連続WS【11/1、11/15、11/19、12/13】）

実施設計（平成28年度発注予定）

建設工事（平成28年度発注予定）

2.9 放射線被ばく検診事業について

事業概要：南相馬市に住所を有する希望者等へ問診、ホールボディカウンター・ベビースキャンによる検査及び診察を行う。

平成27年度予定および実績（10月末日現在）

区分		対象者数	受診者数	受診率	進 捗
乳幼児		2,849人	<u>420人</u>	<u>14.7%</u>	6月から乳幼児用内部被ばく検査（ベビースキャン）を開始。随時、生後6ヶ月の乳幼児に通知を送付。
小学生 (集団)	1回目	2,150人	2,148人	99.9%	小学生 (集団) 学校検診1回目終了
	2回目	2,150人	0人	0%	
中学生 (集団)	1回目	1,353人	1,344人	99.3%	中学生 (集団) 学校検診1回目終了
	2回目	1,353人	0人	0%	
市外避難小中学生		1,533人	60人	3.9%	・随時、申込受付 ・27年1月、各世帯へのガラスバッジの申込書送付の際に申込書同封済。
高校生相当		1,760人	<u>187人</u>	<u>10.6%</u>	
一 般		63,070人	<u>3,632人</u>	<u>5.7%</u>	・6月初旬に市内高校に申込書と返信用封筒を配布済。 ・7月初旬に市内在住の相馬養護学校生徒と市外避難者向け通知を発送済。
合 計			(+388) <u>延7,871人</u>		

上記対象者数は住民基本台帳年齢別人口（平成27年3月31日現在）に基づく

30 個人積算線量計等緊急整備事業について

事業概要：個人線量計を貸与し放射線量を測定するとともに、健康教育（講演会、健康相談等）を実施する。

- 進 捗：・南相馬市放射線健康対策委員会は、4月21日に本年度第1回を行い、本年度の委員会の方針を確認。26年度の未就学児用WBC（Babyscan）による被ばく検査の結果の評価を行う。放射性セシウムの検出者なしと確認。
- ・5月19日に第2回を行い、個人積算線量測定結果（26年度3回目）、放射線被ばく検査26年度下半期分結果の評価や、今後の対応策等について協議、検討を行った。その結果、「ほとんどの測定者は、健康が心配される値ではない。」という評価を得た。
 - ・8月25日に第3回を行い、個人積算線量測定結果（27年度1回目）について、評価を行った。その結果、「ほとんどの測定者は、健康が心配される値ではない。」という評価を得た。

測定期間：平成27年度

実施回数	受診者数	進 捗
1回目(4月～6月)	6,442人	線量計を回収分析。結果発送済
2回目(7月～9月)	6,759人	9月下旬回収開始。分析中
3回目(10月～12月)	6,478人	測定中
4回目(1月～3月)	人	

平成27年度 放射線と健康に関する講演会及び相談会の開催実績：

対象地区	日時	場 所	講 師	人数
市新採用職員	4月3日(金)	市役所正庁	京都大学 渡邊 正己 氏	62人
市管工事組合	7月7日(火)	原町区福祉会館	京都大学 渡邊 正己 氏	50人
駅前サロン	7月15日(水)	市民情報交流センター	東京大学 坪倉 正治 氏	20人
とまとサロン	9月1日(火)	カリタスジャパン 原町ベース	京都大学 渡邊 正己 氏	24人
太田地区まちづくり 委員会	〃	太田生涯学習センター	京都大学 渡邊 正己 氏	53人
原町区老人クラブ 連合会	9月25日(火)	朝日座	京都大学 渡邊 正己 氏	90人
ちゅうりっぷ文庫	11月9日(月)	原町子育て支援センタ 二	東京工業大学 富田 悟 氏	9人

参加者数合計 308人

その他母子保健事業等での相談会実施実績

対象事業	日時	場所	参加者数
4か月児健診	5月7日(木)	鹿島保健センター	14人
4か月児健診	6月16日(火)	原町保健センター	20人
ママカフェ(県事業)	6月19日(金)	原町保健センター	11人
4か月児健診	7月9日(木)	鹿島保健センター	13人
ママカフェ(県事業)	7月17日(金)	原町保健センター	8人
4か月児健診	7月21日(火)	原町保健センター	18人
4か月児健診	8月17日(月)	原町保健センター	20人
ママカフェ(県事業)	8月21日(金)	原町保健センター	14人
4か月児健診	9月3日(木)	鹿島保健センター	14人
4か月児健診	9月15日(火)	原町保健センター	23人
ママカフェ(県事業)	9月18日(金)	原町保健センター	6人
<u>4か月児検診</u>	<u>10月13日(火)</u>	<u>原町保健センター</u>	<u>22人</u>
<u>ママカフェ(県事業)</u>	<u>10月16日(金)</u>	<u>原町保健センター</u>	<u>8人</u>
<u>4か月児検診</u>	<u>11月12日(木)</u>	<u>鹿島保健センター</u>	<u>10人</u>

参加者数合計 201人
