

# 南相馬市復興事業等の主な進捗状況について（平成28年11月15日現在）

## 現在の居住状況

前月から主な変更箇所は下線あり

基準日：平成28年11月18日


上段：（ ）世帯、下段：人口

区名	避難指示区域等名	住民登録状況		市内居住状況				市外居住状況 H28.11.18	備考
		H23.3.11	H28.11.18	旧避難指示区域内		旧避難指示区域外			
				H28.11.18	うち65歳以上	H28.11.18	うち65歳以上		
小高区	帰還困難区域	(1)	(1)	(0)		(1)		(0)	
		2	2	0		2		0	
避難指示区域 計		(1)	(1)	(0)		(1)		(0)	
		2	2	0		2		0	
小高区	旧居住制限区域	(127)	(116)	(11)		(65)		(40)	
		532	448	27	15	203		218	
	旧避難指示解除準備区域	(3,664)	(3,018)	(469)		(1,481)		(1,068)	
		12,308	9,102	966	546	3,956		4,180	
計		(3,791)	(3,134)	(480)		(1,546)		(1,108)	
		12,840	9,550	993	561	4,159		4,398	
原町区	旧居住制限区域	(7)	(5)	(0)		(4)		(1)	
		12	6	0	0	5		1	
	旧避難指示解除準備区域	(377)	(290)	(95)		(145)		(50)	
		1,427	903	232	120	456		215	
計		(384)	(295)	(95)		(149)		(51)	
		1,439	909	232	120	461		216	
旧避難指示区域 計		(4,175)	(3,429)	(575)		(1,695)		(1,159)	
		14,279	10,459	1,225	681	4,620		4,614	
原町区	その他の区域 （の区域を除く）	(16,401)	(16,856)	1	(3)	(15,751)		(1,102)	1 小高区内居住：1世帯,1人
		45,677	41,896	1	4	37,463	13,436	4,429	原町区内居住：2世帯,3人
鹿島区	その他の区域 （の区域を除く）	(3,462)	(3,726)	2	(1)	(3,634)		(91)	2 小高区内居住：1世帯,2人
		11,603	10,849	2	2	10,447	4,151	400	
その他の区域 計		(19,863)	(20,582)	(4)		(19,385)		(1,193)	
		57,280	52,745	6		47,910	17,587	4,829	
合計		(24,039)	(24,012)	3	(579)	(21,081)		(2,352)	3 小高区内居住：482世帯,996人
		71,561	63,206	3	1,231	52,532	17,587	9,443	原町区内居住：97世帯,235人

世帯数と人口の算出方法

- 1 住民登録状況の世帯数と人口は、基準日現在の住民基本台帳を基に算出しています。
- 2 居住状況の世帯数と人口は、基準日現在の避難者情報を基に算出しています。

### 市内の区域別の状況

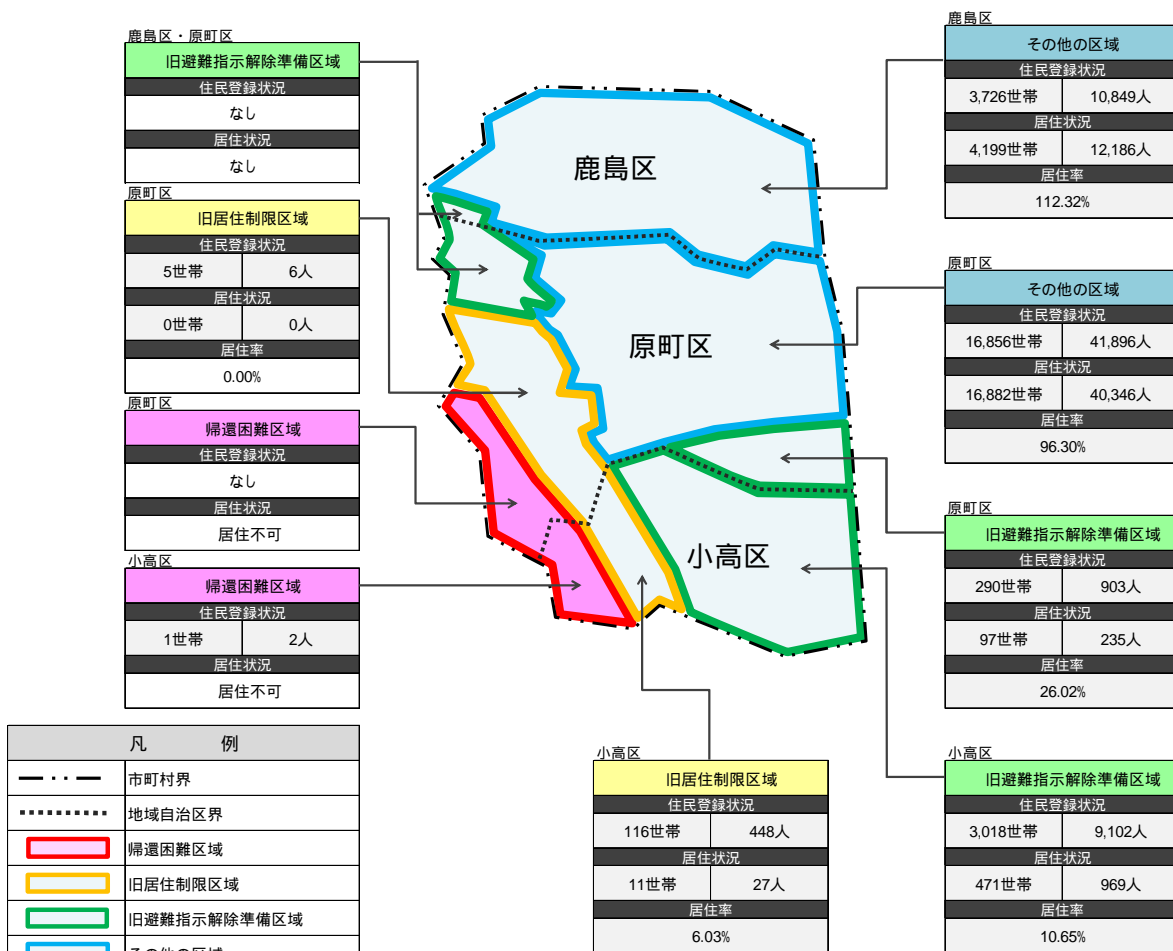

平成28年7月12日避難指示解除



## 2 事後モニタリング・フォローアップ除染事業（市事業）

### 事後モニタリングについて

事業概要： 除染が終了した宅地等において、除染の効果が維持されているか、また、除染作業において放射性物質の取り残しがないかを確認する。その中で、再汚染等により除染の効果が維持されていない或いは放射性物質の取り残しがあった箇所については、フォローアップ除染に繋げていく。

完了目標： 平成 28 年度末


進捗状況： 除染実施地区に順次案内を発送中。  
今月は片倉の事後モニタリングが完了し、馬場において事後モニタリングを継続実施中。

【当面の予定】

4月～：案内の発送、事後モニタリングの実施

6月～：環境省協議中

### 事後モニタリング



## 3 農地除染事業（その他の区域）について（市事業）

事業概要：市除染実施計画及び市農地除染基本方針に基づき、農地除染を実施し放射線量の低減に資する。

完了目標：平成 28 年度末


進捗：当初発注分の除染については平成 27 年度に完了した。

平成 28 年度については、追加して除染の必要が生じた農地等について除染を実施する。


平成 27 年度までの実績：水路除染 1,506 km、農地除染 4,071 ha、農道除染 210 km

【平成 28 年度予定分（平成 28 年 11 月 15 日時点）】


### 一時集積所撤去




### 水路除染



### 農地除染



### 農道除染



#### 4 旧避難指示区域除染事業について（国事業）

事業概要：環境省は、特別地域内除染実施計画（南相馬市）に基づき、旧警戒区域及び旧計画的避難区域において除染を実施し放射線量の低減に資する。

完了目標：平成 28 年度末

除染実施率：（平成 28 年 9 月 30 日現在）

	実施率	実績量	対象数量
宅地	96%	約 4,300 件（約 4,200 件）	約 4,400 件
	100% 1	約 4,000 件 1	約 4,000 件 2
農地	39%（38%）	約 1,200ha（約 1,100ha）	約 3,100ha
森林	70%（69%）	約 810ha（約 800ha）	約 1,200 ha
道路	47%（39%）	約 150ha（約 120ha）	約 320ha

（ ）内は前月

1 は、平成 27 年度までに除染を行える環境が整った画地数に係る実施率

2 は、平成 27 年度までに除染を行える環境が整った画地数

区分	行政区	除染	仮置場
第四・五工区	金谷、川房、大田和、神山	実施中	それぞれの地域に設置 造成・搬入中
	羽倉、大富		
	南鳩原、飯崎、片草、北鳩原、 小谷、上根沢、小屋木	実施中	上段の行政区を除く、西部及び中部については、小谷、南鳩原、北鳩原、片草に跨る地域に設置し、造成・搬入中。
	1 区から 5 区、岡田、大井、小高、吉名、 川原田、女場、上蛭沢、下蛭沢、浦尻、 行津、上浦、角部内、上耳谷、下耳谷、 福岡、泉沢、下浦、塚原、村上、井田川	実施中	神山を除く東部については、 行津地区に設置し、造成・搬入中
	高一・二、小浜、江井、堤谷、米々沢、 鶴谷、雫、小木迫、下江井、小沢、大甕	実施中	太田・大甕地区に造成・設計中
第一から三工区引き継ぎ分及び 20 km 圏外にある居住制限区域	実施中	上記仮置場及び馬場・高倉の 山側に仮置場の設計・造成中	
公共施設	-	実施中	（現地保管）

着手済：一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）のうち、何らかの行為が行われた状態

除染完了：一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した状態

#### 廃棄物処理関係

#### 5 災害廃棄物処理事業（旧避難指示区域）について（国事業）

事業概要：環境省が旧警戒区域内のがれき処理、片付けごみ処理、被災・荒廃家屋の解体撤去、被災車両の撤去を行うもの。



完了目標：平成 28 年度末

災害廃棄物搬入量（津波がれき、片付けごみ、解体家屋等）

470,594 t（津波がれきは搬入完了）

被災家屋解体撤去率（H28 年 10 月末受付分）

荒廃家屋撤去率（H28 年 10 月末受付分）




## 6 災害廃棄物処理事業（その他の区域）について（市事業）

事業概要：市が旧警戒区域外のがれき処理、倒壊家屋の解体撤去、被災自動車の撤去を行うもの。


完了目標：平成 28 年度末

災害がれき搬入率



完了

損壊家屋解体撤去率



完了

### 住宅関係

## 7 宅地造成事業について

事業概要：本市へ個別移転や定住を希望する原発被災者及び津波罹災者に対し、市街地へ分譲住宅地を提供する。

原町区大木戸地区 68区画

完了目標：平成 28 年度中

進 捗：設計・施工一括工事発注済（設計完了・工事着工）

## 8 県復興公営住宅の整備について（県事業）

事業概要：県において、原子力災害により避難指示を受けている方（南相馬市以外の避難者含む）が、低廉な家賃で入居できる公営住宅の整備を進めている。


進捗状況：

地区	戸数	住居形態	進捗	入居目標年度	
原町	北原	264 戸	集合住宅	建築工事中	H28 年度前期
	上町	182 戸	集合住宅	建築工事中	H28 年度後期
	辻内	176 戸	集合住宅	造成中 / 建築工事中	H28 年度後期
	南町	255 戸	集合住宅	建築工事中	H28 年度後期
鹿島	西町	50 戸	戸建住宅	造成中	H28 年度後期
合計	927 戸				

### 都市基盤関係


## 9 道路復旧事業について（市事業）

（旧避難指示区域）



前月同様

（その他区域）



前月同様

区域	被災概要	完了予定	被災箇所	工事発注	完了	完了率
旧避難指示区域	地震災害道路	完了	92	92	92	100%
	津波災害道路	29年度内	35	30	29	84%
	橋梁災害道路	29年度内	5	4	4	80%
その他の区域	地震災害道路	完了	73	73	73	100%
	津波災害道路	29年度内	46	38	38	83%
	橋梁災害道路	完了	4	4	4	100%

## 10 道路復旧事業について（県事業）

### 災害復旧事業

区域	区分	被災箇所	着手箇所	完了箇所	概要
旧避難指示区域	道路災害復旧事業	43	43	40	・全箇所発注済み。
	橋梁災害復旧事業	6	6	4	
その他の区域	道路災害復旧事業	26	26	25	・道路は、平成28年度に完了予定。
	橋梁災害復旧事業	3	3	3	

### その他の事業

区分	状況
県道原町川俣線八木沢工区（道路改良）	・トンネル工事の起工式を平成26年3月25日に行い、トンネル工事を実施中。平成28年3月20日にトンネルが貫通。平成30年の降雪期前に全線開通を目指す。
県道大芦鹿島線檜原工区（道路災害復旧工事含む）	・平成26年8月に工事着手、平成28年9月29日に再開通した。
県道原町海老相馬線	・南海老地内は、26年7月に工事着手し、平成30年度の完了を目指す。 ・烏崎地内は、27年4月に工事着手し、平成29年度の完了を目指す。 ・沖田地内は、27年7月に工事完了。

区分	状況
県道北泉小高線	旧避難指示区域 ・26年度に概略設計完了。 ・28年度は引き続き調査・予備設計を行う。 その他の区域 ・萱浜地内の嵩上げ区間は、26年6月に工事着手。 ・雫地内のハイパス区間は、27年3月に工事着手。
県道広野小高線	旧避難指示区域 ・26年度に概略設計完了。 ・28年度は引き続き調査・予備設計を行う。



## 1 1 都市防災推進事業（北泉海浜総合公園の復旧等）について

事業概要：被災した北泉海浜総合公園を、震災前のように市民の憩いの場として復旧・復興するため、地域住民等と一緒に取り組み整備を図る。

完了目標：平成 29 年度

進 捗：

- ・高台エリアの災害復旧工事は、27 年 3 月未完了。  
土木工事...都市公園施設等 電気工事...配電線路設備等 機械工事...屋外排水設備等
- ・津波被害エリアの災害査定は 26 年 11 月 17～18 日に実施、査定率 98.5%。28 年度末の工事完了予定。
- ・北泉海浜総合公園に隣接する、防災集団移転事業で買い取った土地の一部を利用して震災メモリアルパークの整備をする。平成 29 年度完成見込み。  
設計・・・平成 28 年度  
工事・・・平成 29 年度

## 1 2 河川災害復旧事業について

（旧避難指示区域）

- ・復旧箇所：1 箇所（小沢川）
- ・災害査定は 25 年 10 月に完了。27 年 8 月に工事を発注し 27 年度工事を完了

（その他の区域）

- ・復旧箇所：4 箇所（金沢川 3 箇所、真野川右支）
- ・災害査定はすべて 25 年 6 月に完了。金沢川 3 箇所は 26 年 3 月に工事完了。真野川右支は、26 年 9 月に工事を発注し 27 年度工事を完了。

## 1 3 河川・海岸災害復旧事業について（県事業）

区域	区分	被災箇所	着手箇所	完了箇所	概要
旧避難指示区域	河川災害復旧事業	45	45	36	河川は全箇所発注済み。
	海岸災害復旧事業	9	9	4	
その他の区域	河川災害復旧事業	17	17	14	真野川は平成 28 年度内に工事完了予定。
	海岸災害復旧事業	5	5	2	

## 1 4 海岸災害復旧事業（農林海岸部）について（県事業）

旧避難指示区域 5,325m

- ・農地海岸堤防については復旧工事に着手。（30 年度完了予定）

その他の区域 1,074m

- ・農地海岸堤防については復旧工事に着手。（27 年度完了予定）
- ・漁港海岸堤防については復旧工事に着手。（28 年度完了予定）

## 1 5 海岸防災林造成事業について（県・市事業）

事業概要：総延長約 17.0 km、林帯幅 200m、中央部分に津波で発生した瓦礫（再生資材）を盛土として利用。

県施工 植生基盤盛土等

鹿島区は、25年4月から市有地において工事に着手。現在、北海道、南海老地区において工事を実施中。原町区においては、平成26年3月から萱浜・雫地区において工事に着手。小高区においては、現在、塚原地区において工事を実施中。用地測量完了地区から順次用地買収を進め工事実施予定としている。

#### 市施工 再生資材盛土部分

- ・ 施工時期について関係機関と協議を進めている。
- ・ 20 km圏外については、原町区南萱浜・雫地区及び北泉地区において造成完了。
- ・ 現在、鹿島区海老・右田地区及び原町区渋佐・北萱浜地区において造成工事実施中。鹿島区烏崎地区は平成28年12月から工事実施予定。
- ・ 20 km圏内については、塚原地区、村上地区及び浦尻地区、角部内地区で小高区内の家屋解体瓦礫及びJR常磐線の復旧工事からでる砕石等を高盛土部分へ盛土材搬入中。

### 経済関係

#### 16 農地・農業用施設災害復旧事業について

##### 旧避難指示区域

市営事業：平成24年度37箇所、平成25年度75箇所、平成26年度20箇所、平成27年度10箇所について災害査定済。

災害箇所数 142箇所（農地34、ため池43、道路21、水路15、橋梁2、揚水機11、頭首工10、除塩6）

発注済 16（田4、道路2、ため池7、排水1、揚水機1、頭首工1）

完了23（田4、道路4、ため池13、橋梁2、）

県営事業：小高排水機場（完了）、原町南部地区（農地）復旧中。

国営事業：3排水機場（谷地・村上第二・塚原第二）について応急復旧工事が完了。

5排水機場（小沢、谷地、塚原第二、村上、福浦南部）本復旧工事中。

1排水機場（小浜）完了

##### その他の区域

市営事業：概ね完了。（一部圃場整備計画内に復旧箇所があるが廃工予定）

県営事業：平成25年度に3排水機場復旧工事完了（八沢、泉、前向）。

平成27年度に1排水機場復旧工事完了（八沢浦）。

1排水機場復旧工事中（金沢）。

#### 17 農山漁村地域復興基盤総合整備事業について（県事業）

地区	事業地区	完成予定	県営土地改良事業計画確定	工事契約	工事着手
鹿島	八沢	31年度末	25年12月	26年3月	26年6月
	右田・海老	31年度末	26年1月	26年12月	27年1月
	真野	32年度末	26年2月	27年9月	27年10月
原町	金沢・北泉	29年度末	25年5月	27年9月	27年10月
	原町東	31年度末	25年7月	26年3月	26年5月
	原町南部	31年度末	12年10月	26年3月	26年3月



## 1 8 真野川漁港整備事業について

事業概要：本格的な操業再開に向けて各施設を整備する。

完了目標：（25年度）漁船保全修理施設済、  
（26年度）漁具倉庫済  
（27年度）水産物鮮度保持施設、水産物荷捌き施設、海水処理施設、  
作業場  
（28年度）オイルフェンス

進 捗：漁船保全修理施設建設工事については、26年3月に工事完了。  
漁具倉庫については、27年3月に工事完了。水産物荷捌き施設及び  
海水処理施設、水産物鮮度保持施設、作業場については28年3月に工事  
完了。オイルフェンスについては28年度中に工事完了予定。

## 1 9 被災地域農業復興総合支援事業（施設園芸）について

事業概要： 早期の営農再開と風評被害克服のため、園芸施設（養液栽培）を整備  
する。24年度に原町区泉地区にドーム型の施設を整備済み。第2弾とし  
て鹿島区南海老地区に大型ハウスを整備し貸し出す事業。

進 捗： ・26年3月～4月に施設の貸与者の公募を実施。（公募件数：1件）  
・26年7月に貸与者の決定。  
・27年6月～8月に地質調査及び測量設計業務を実施。  
・27年9月に公募型プロポーザルによる事業請負業者の公募実施。  
・28年7月に施設の一部（2号棟）を供用開始。  
・28年8月に施設の一部（7号棟、事務所棟）を供用開始。  
・28年9月に施設の一部（1号棟、6号棟）を供用開始。以降、**早期**の  
完成を目指す。

## 2 0 鮭繁殖施設整備事業（原町区）について

事業概要： 鮭の資源を確保し、歴史と伝統のある鮭の遡上を後世に引き継ぐために  
被災したふ化施設を整備する。

進 捗： ・28年5月までに施設用地の確認を行った。  
・28年5月に設計を発注した。（工期7月～10月）  
・28年12月に工事を発注する。（工期1月～3月）

## 2 1 小高区仮設店舗開設事業について

事業概要：避難指示解除準備区域等に指定されていた小高区において、帰還住民の生  
活基盤を確保し、帰還促進を図るため、平成27年9月に開設した生活必需  
品等を販売する仮設店舗を運営する。

- ・店舗営業時間：午前9時から午後7時まで（日曜定休）
- ・取扱い商品：食料品（肉・野菜等の生鮮食品を含む）飲料品、弁当、酒類、  
たばこ、日用雑貨等

## 2.2 小高区商業施設整備事業について

事業概要： 小高区の帰還住民の利便性の向上と街なかの賑わい、また帰還について検討している住民の帰還意欲を向上させるため、住民の多くが望んでいる食料品等小売店舗を整備する。

完了目標： 平成 30 年度 （平成 30 年度中の開店を目指す）

進 捗： 平成 28 年度 地質調査、基本計画の作成  
 平成 29 年度 用地取得、実施設計の作成、建設工事  
 平成 30 年度 供用開始

## 2.3 (仮称)南相馬市復興工業団地整備事業について

事業概要： 原町区渋佐・萱浜地区に工業団地を造成し、「ロボットテストフィールド」、「国際産学官共同利用施設」を整備し、ロボット関連産業を市の主要産業に成長させる。

完了目標： 平成 29 年度末 （平成 28 年度末 一部供用開始）

進 捗： 平成 24 年度 測量、地質調査、基本計画を作成。  
 平成 25 年度 基本設計 12 月に完了。埋蔵文化財調査を 3 月に完了。  
 平成 26 年度 第 1 期造成工事発注  
 平成 28 年度 第 2 期造成工事発注予定  
 ロボットテストフィールド整備着工予定(福島県)  
 平成 30 年度 ロボットテストフィールド供用開始予定

### 教育関係

## 2.4 学習塾等と連携した学力強化推進事業について

事業概要：学習塾と連携して中学校第 2 学年、3 学年に学習塾講師を派遣し授業等実施。  
 夏季休業中に第 3 学年のうち希望者を対象とした集中講座を開講。（学習塾講師に加えて大学生、卒業生も活用）

・実施教科：数学、英語

・実施回数：第 3 学年 7 月～ 2 月 月 2 日程度

第 2 学年 10 月～ 1 月 月 2 日程度、長期休業中月 2 日程度

8 月 3 日（火）～ 5 日（木）集中講座

実施日	実施日	実施校等	対象	内容
通常講座	7 月～ 2 月	市内各中学校	中学 3 年生	・仙台進学プラザ講師 ・数学、英語の 2 教科 ・基本徹底、応用発展の 2 コース
夏季集中講座	8 月 3 日 ～ 8 月 5 日	市労働福祉会館 ほか 3 会場	3 年生の 希望者	・仙台進学プラザ講師 ・卒業生 ・国語、数学、英語の 3 教科 ・通常、ハイクラスの 2 コース

通常講座	10月～1月	市内各中学校	中学2年生	・仙台進学プラザ講師 ・数学、英語の2教科 ・基本徹底、応用発展の2コース
------	--------	--------	-------	---

## 2.5 児童生徒の健康を守る安全・安心対策の実施について

事業概要：外出や屋外活動等を控えている児童生徒の精神的ストレスや運動不足の解消を図るため、学校へ専門家を派遣する。

- ・医師やスポーツトレーナーを派遣し、児童生徒に望ましい生活習慣や運動習慣を身につけてもらうための講話や実技講習会の実施。
- ・放射線に関する知識を有する専門医等を派遣し、保護者や教職員等対象に研修会の実施。（6月から事業開始）

### 平成28年度実績

実施日	学校	講師	内容	対象
6月24日	鹿島中	南相馬市立総合病院医師 坪倉正治 氏	講演「放射線と健康管理」	全生徒 教職員
6月27日	上真野小	日本原子力学会会員 河田 東海夫 氏	放射線の基礎、南相馬市の食べ物 放射線の測定、内部被曝検査について 等	1～6年
6月28日	原一小	福島大学トラッククラブ コーチ 菊田明博 氏	陸上運動につながる動き作り	5・6年生
7月11日	太田小	スポーツアカデミー相馬 永沢 氏、岩佐 氏	全児童による水泳指導及びスポーツ指導	全児童
7月13日	原二小	野外教育事業所 ワンパク大学 三好利和 氏	レクリエーション室内運動	1・2年
7月15日	八沢小	神戸学院大学 磯部 久美氏	講演「南相馬市の除染状況と健康への影響」	保護者 教職員
9月5日	原一中	上智大学心理学科教授 久田 満 氏	「心のエクササイズ」 (リラクゼーションの授業)	1・2年 教職員
9月8日	高平小	福島大学トラッククラブ コーチ 二瓶秀子 氏	陸上運動 スプリント指導	5・6年生
9月30日	原三小	日本体育協会公認ジュニア スポーツ指導員 安齋博勝 氏	コーディネーション運動	1・2年生
10月5日	石神中	獨協医科大学 RI センター 高橋克彦 氏	放射線の基礎知識の理解と思考・判断・行動力の育成	1年生 教職員
10月12日	小高・福浦・金房・鳩原小	福島大学トラッククラブ コーチ 菊田 明博 氏	精神的ストレスや運動不足解消のためのレクリエーション活動	全児童

## 2.6 市内の幼稚園・保育園の授業料等の無料化について

事業概要：・幼稚園授業料無料化事業

（公立幼稚園授業料を無料、私立幼稚園在籍園児の保護者に対して実質無料となるよう補助する。）

- ・保育園（所）保育料無料化事業
- ・認定こども園・小規模保育事業所等保育料無料化事業

(私立認定こども園・私立小規模保育事業所等在籍園児の保護者に対して実質無料となるよう補助する。)

・認可外保育施設入所支援事業

(認可外保育施設に入所する児童に対して保育料の一部を助成する。)

**参考：幼児・児童・生徒の在籍状況**

(幼児数)

区分	(参考)					H28. 11.1		
	H23.5.6 園児数	H24.4.1 園児数	H25.4.1 園児数	H26.4.1 園児数	H27.4.1 園児数	園児数 ( )は前月	対前月	待機 児童
保育園	167 人	394 人	462 人	478 人	608 人	679 (677) 人	+2 人	96 人
幼稚園	0 人	375 人	462 人	494 人	533 人	578 (571) 人	+7 人	
計	167 人	769 人	924 人	972 人	1141 人	1,257 (1,248) 人	+9 人	

( 保育園の区分には、認定こども園、小規模保育事業の園児数が含まれている。)

(小学校児童数)

区名	H27.4.6 在籍者数 A	H28 年度 予定人数 B	H28.3.1 在籍者数 C	H28.4.6(1学期開始日)			
				在籍者数 D	対予定 D/B	対前年 D - A	対前回 D - C
原町区	1,470 人	2,100 人	1,499 人	1,549 人	74%	+79 人	+50 人
鹿島区	546 人	559 人	546 人	527 人	94%	19 人	19 人
小高区	134 人	427 人	135 人	92 人	22%	42 人	43 人
計	2,150 人	3,086 人	2,180 人	2,168 人	70%	+18 人	12 人

(中学校生徒数)

区名	H27.4.6 在籍者数 A	H28 年度 予定人数 B	H28.3.1 在籍者数 C	H28.4.6(1学期開始日)			
				在籍者数 D	対予定 D/B	対前年 D - A	対前回 D - C
原町区	960 人	1,182 人	961 人	892 人	76%	68 人	69 人
鹿島区	293 人	328 人	297 人	309 人	94%	+16 人	+12 人
小高区	100 人	299 人	100 人	89 人	30%	11 人	11 人
計	1,353 人	1,809 人	1,358 人	1,290 人	71%	63 人	68 人

(高等学校生徒数) ・県教育委員会聴き取りによる ・定員は第1～3学年の合計

区分	H22.5.1 現在		H26.4.9 現在		H27.4.9 現在		H28.4.11 現在		サテライト校(場 所)
	定員	在籍者数	定員	在籍者数	定員	在籍者数	定員	在籍者数	
小高商業高等学校	240 人	217 人	240 人	141 人	240 人	164 人	240 人	151 人	原町高等学校
小高工業高等学校	600 人	588 人	400 人	305 人	360 人	290 人	400 人	329 人	南相馬市サッカー場
原町高等学校	720 人	708 人	520 人	452 人	480 人	452 人	480 人	465 人	
相馬農業高等学校	360 人	331 人	360 人	281 人	360 人	243 人	360 人	229 人	
相馬農業高等学校飯館校	120 人	88 人	120 人	54 人	120 人	69 人	120 人	69 人	福島明成高等学校
相馬高等学校	720 人	705 人	600 人	583 人	600 人	591 人	600 人	587 人	
相馬東高等学校	720 人	711 人	520 人	502 人	480 人	479 人	480 人	473 人	
新地高等学校	240 人	202 人	240 人	180 人	240 人	166 人	240 人	171 人	

学校間連携校としてJFAアカデミー福島に在籍する生徒が通っている

富岡高等学校のいわき明星大学サテライトは在校生の卒業に伴って

平成28年度に閉鎖

## 2.7 子どもの遊び場整備事業について

事業概要：子育てしやすい環境を整備することを目的として、子どもが楽しく、安心して遊ぶことができる施設を整備する。

施設名称：かしまわんぱく広場

場所：鹿島区鹿島字北千倉地内

完了目標：平成28年4月竣工（平成28年4月供用開始）

進捗状況：プロポーザル方式による一括発注

- ・プロポーザルの実施（平成27年7月～8月）
- ・実施設計（平成27、年10月）
- ・ボーリング調査（平成27年9月）
- ・倉庫解体（平成27年11月～12月）
- ・駐車場整備工事（平成27年11月～平成28年1月）
- ・建設工事（平成27年12月～平成28年4月）
- ・遊具設置・外構工事（平成28年2月～平成28年4月）
- ・平成28年4月18日完成
- ・平成28年4月22日竣工式実施

## 原子力災害の克服（除染以外）関係

### 2.8 再生可能エネルギー導入推進事業について

事業概要：市が再生可能エネルギー発電基地の事業用地（市有地）を確保し、SPCが発電所を建設、運営を行う。

（沿岸部大規模太陽光発電所）

- ・平成25年3月に復興整備計画に基づく土地利用方針の国同意を得て、権利移転に向けて手続きを進めている。
- ・平成26年4月にSPC（ソーラーパワー南相馬株）設立。
- ・平成28年3月に事業者へ太陽光発電所用地（鹿島区）を引き渡し。
- ・平成28年5月に太陽光発電所（鹿島区）の工事着工。

発電所名(仮称)	発電規模	計画場所・面積	工事着手
南相馬真野右田海老太陽光発電所	45.5MW	真野地区(約48ha)	28年5月 運転開始
		右田・海老地区(約58ha)	30年3月予定
南相馬原町東太陽光発電所	24MW	下渋佐・萱浜地区 (約46ha)	<b>29年2月予定</b> 運転開始 30年秋予定

（沿岸部風力発電所）

- ・平成25年6月にSPC（株南相馬サステナジー）設立。
- ・平成26年2月に環境アセスメント（特定環境影響評価）の手続き完了。
- ・海岸防災林造成事業等との調整を図り、保安林解除に向けて県と協議を進めている。

発電所名(仮称)	発電規模	計画場所・面積	工事着手
万葉の里風力発電所	9.4MW	鹿島区南海老・北右田・	29年4月予定
	(2,350kW ×4基)	南右田地区 (約5,000㎡×4箇所)	運転開始 30年3月予定

## 公共施設再生可能エネルギー導入

事業概要：再生可能エネルギーの推進や、災害時における防災拠点施設等の最低限の機能維持を図るため、公共施設へ再生可能エネルギー設備及び蓄電池設備を導入する。

	施設名	設備容量		導入年度	進捗状況
		太陽光	蓄電池		
1	鹿島区役所	30.38kW	32.4kWh	25年度	26年1月工事完了
2	鹿島保健センター	16kW	22kWh	25年度	26年1月工事完了
3	原町保健センター	20kW	30kWh	25年度	26年3月工事完了
4	原町第一小学校	20kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
5	原町第二小学校	20kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
6	石神第一小学校	20kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
7	鹿島小学校	20kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
8	上真野小学校	15.75kW	22kWh	26年度	27年2月工事完了
9	大甕小学校	20kW	22kWh	26～27年度	27年11月工事完了
10	太田小学校	16kW	22kWh	26～27年度	27年9月工事完了
11	原町第三小学校	20.8kW	22kWh	27年度	28年3月工事完了
12	石神第二小学校	20.8kW	22kWh	27年度	28年3月工事完了
13	南相馬市役所	37.44kW	33kWh	27年度	27年11月工事完了
14	高平小学校	20kW	22kWh	27年度	27年11月工事完了
15	八沢小学校	20kW	22kWh	27年度	27年12月工事完了
16	小高小学校	15.75kW	22kWh	27年度	27年11月工事完了
17	原町第一中学校	20kW	20kWh	29年度	28年7月実施設計発注
18	原町第二中学校	20kW	20kWh	29年度	28年7月実施設計発注
19	原町第三中学校	20kW	20kWh	29年度	28年7月実施設計発注
20	石神中学校	20kW	20kWh	29年度	28年7月実施設計発注
21	鹿島中学校	20kW	20kWh	29年度	28年7月実施設計発注
22	小高中学校	20kW	20kWh	29年度	28年7月実施設計発注

## 2.9 小高区復興拠点施設整備事業について

事業概要：原子力災害による避難指示によって機能停止となった小高区の再生に向けて、住民が帰還し、安心して生活できる環境を整備し、復興の足掛かりなる復興拠点施設を整備する。

実施期間：平成30年10月（工事完了予定）

今後の予定：基本設計（平成28年5月末完了）

実施設計（平成28年度発注予定）

建設工事（平成29年度発注予定）

## 3.0 放射線被ばく検診事業について

事業概要：南相馬市に住所を有する希望者等へ問診、ホールボディカウンター・ベビースキャンによる検査及び診察を行う。



区分		対象者数	受診者数	受診率	進 捗
乳幼児		2,743 人	584 人	21.3%	4月末に個別通知を発送 6月から乳幼児用内部被ばく検査 (ベビースキャン)を開始。
小学生 (集団)	1回目	2,168 人	2,161 人	99.7%	学校検診1回目7月終了
	2回目	人	0 人	0%	学校検診2回目 11月開始予定
中学生 (集団)	1回目	1,288 人	1,277 人	99.1%	学校検診1回目7月終了
	2回目	人	0 人	0%	学校検診2回目 11月開始予定
市外避難小中学生		1,171 人	64 人	5.5%	・随時、申込受付 ・28年3月、申込書を広報紙と一 緒に全戸配布。 6月上旬に高校生に個別通知と共 に、市外通学者に各市内高等学校 を通じて申込書を配布。
高校生相当		1,752 人	323 人	18.4%	
一 般		63,969 人	1,862 人	2.9%	
合 計			延 6,271 人		割合は小数点第二位を四捨五 入しております。

上記対象者数は住民基本台帳の登録者数及び平成 23 年 3 月 12 日以降の転出者数に基づく(平成 28 年 3 月 31 日現在)

### 3 1 個人積算線量計等緊急整備事業について

事業概要：個人線量計を貸与し放射線量を測定するとともに、健康教育（講演会、健康相談等）を実施する。

- 進 捗：・南相馬市放射線健康対策委員会は、4月19日に本年度第1回を行い、本年度の委員会の方針、放射線健康調査系の事業概要を確認。外部被ばく測定の結果通知の方法について検討した。
- ・7月5日に第2回を行い、個人積算線量測定結果（27年度4回目）、放射線被ばく検査27年度下半期分結果の評価について協議、検討を行った。その結果、「ほとんどの測定者は、健康が心配される値ではない。」という評価を得た。
  - ・11月14日に第3回を行い、個人積算線量測定結果（28年度1回目）、放射線被ばく検査28年度上半期分結果の評価について協議、検討を行った。その結果、「ほとんどの測定者は、健康が心配される値ではない。」という評価を得た。また、29年度の内部被ばく検診の実施方針についても協議を行った。

測定期間：平成 28 年度

実施回数	貸与数	進 捗
1回目(4月～6月)	6,300 人	線量計回収分析。結果発送済。
2回目(7月～9月)	6,307 人	線量計回収、分析中。
3回目(10月～12月)	6,338 人	線量測定中。
4回目(1月～3月)	人	

平成 28 年度 その他母子保健事業等での相談会実施実績：

対象事業	日 時	場 所	参加者数
ママカフェ(県事業)	4月11日(月)	原町保健センター	2人
4か月児健診	4月19日(火)	原町保健センター	26人
4か月児健診	5月17日(火)	原町保健センター	15人
ママカフェ(県事業)	6月6日(月)	原町保健センター	11人
3歳児健診	6月9日(木)	鹿島保健センター	14人
4か月児健診	6月14日(火)	原町保健センター	26人
3歳児健診	6月16日(木)	原町保健センター	15人
4か月児健診	7月7日(木)	鹿島保健センター	9人
4か月児健診	7月19日(火)	原町保健センター	18人
3歳児健診	7月21日(木)	原町保健センター	15人
4か月児健診	8月16日(火)	原町保健センター	24人
3歳児健診	8月18日(木)	原町保健センター	10人
3歳児健診	8月25日(木)	鹿島保健センター	9人
4か月児健診	9月8日(木)	鹿島保健センター	11人
4か月児健診	9月13日(火)	原町保健センター	19人
3歳児健診	9月15日(木)	原町保健センター	17人
3歳児健診	10月13日(木)	鹿島保健センター	17人
3歳児健診	11月10日(木)	原町保健センター	20人

その他

参加者数合計 278人

### 3 2 防災備蓄倉庫整備事業

事業概要：東日本大震災によりこれまでの想定を上回る甚大な被害を受け、長期間にわたる断水、停電に加え物流機能の麻痺などにより各種支援物資の円滑な供給が困難な状況に陥った教訓を生かし、避難直後から食料、飲料水及び必要な物資が確保され円滑な供給が行えるよう、防災備蓄倉庫を整備する。

建設予定地・・・萱浜ニュースポーツ広場

(南相馬市原町区萱浜字砂掛場45番地134)

構 造・・・鉄骨平屋建

主用途・・・倉庫、事務室、ホール、トイレ等

スケジュール：造成設計(平成28年6月～10月)

実施設計(平成28年7月～12月)

造成工事(平成28年11月～平成29年3月)

建築工事(平成29年3月～平成29年12月)

外構工事(平成29年8月～平成29年12月)

〔防災備蓄倉庫の配置方針〕

防災備蓄倉庫は、貨物車の物資の搬出入に配慮した配置とする  
 防災備蓄倉庫は、南側主道路から分かり易いファサードとする  
 大型貨物車が備蓄品の搬出入を行うことを踏まえて、大型車が敷地に進入し備蓄倉庫室から直接的に物資の搬出入を行い、敷地外へと安全かつ円滑に通行できる動線を確認する  
 物資搬出入のための貨物車と施設作業関係者の乗用車の動線が交錯しないよう計画する  
 大型車を含む搬出入のための貨物車及び施設内作業のための職員等の駐車場を確保する

### 3.3 避難所看板整備事業

事業概要： 避難体制の強化及び防災意識の高揚を図るため、避難所、避難路、海抜・津波到達点の表示板の整備を行う。

スケジュール： 【避難所看板の設置等】

設置工事：平成28年3月～平成28年12月

【情報看板等設置】

配置計画の検討：平成28年4月～

配置計画（案）の作成：平成28年6月～

設置工事：平成28年10月～平成29年1月
